

ALLEGATO "A"

Comune di Tolentino
Provincia di MC

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Fornitura e posa in opera per la realizzazione di un nuovo impianto di selezione da raccolta differenziata presso COSMARI S.r.l.

COMMITTENTE: COSMARI S.R.L.

CANTIERE: Località Piane del Chienti, Tolentino (MC)

Tolentino, 01/09/2017

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA


(Ingegnere PANEPINTO ANTONINO)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(COSMARI S.R.L.)



Vartema Srl

Via Roma, 12 - 33044 Manzano (UD)

Tel. 0432 16 36 612 info@vartema.it

www.vartema.it

CerTus by Guido Cianiulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
ALLESTIMENTO CANTIERE						
Allestimento di cantiere	1	1	2	2		
FORNITURA E POSA IMPIANTO DI SELEZIONE						
PRESSA IMBALLAGGIO RIFIUTI	1	1	5	5		
LETTORI OTTICI	1	1	5	5		
SISTEMA ARIA COMPRESSA	1	1	5	5		
NASTRI TRASPORTATORI	1	1	10	12		
TAPPETI	1	1	4	6		
APRISACCHI	1	1	5	7		
VAGLIO ROTANTE	1	1	5	7		
VAGLIO BALISTICO	1	1	2	2		
SEPARATORE MAGNETICO	1	1	3	3		
SEPARATORE PER METALLI NON FERROSI	1	1	3	3		
QUADRO ELETTRICO/AUTOMAZIONE	1	1	39	54		
CABINA DI SELEZIONE ED IMPALCATI	1	1	10	15		
IMPIANTO ASPIRAZIONE	1	1	10	14		
VERIFICA FUNZIONAMENTO IMPIANTO						
COLLAUDO IMPIANTO	1	1	3	5		
SMOBILIZZO CANTIERE						
Smobilizzo cantiere	1	1	2	2		

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA


Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

1) = Impresa

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

[illegible]

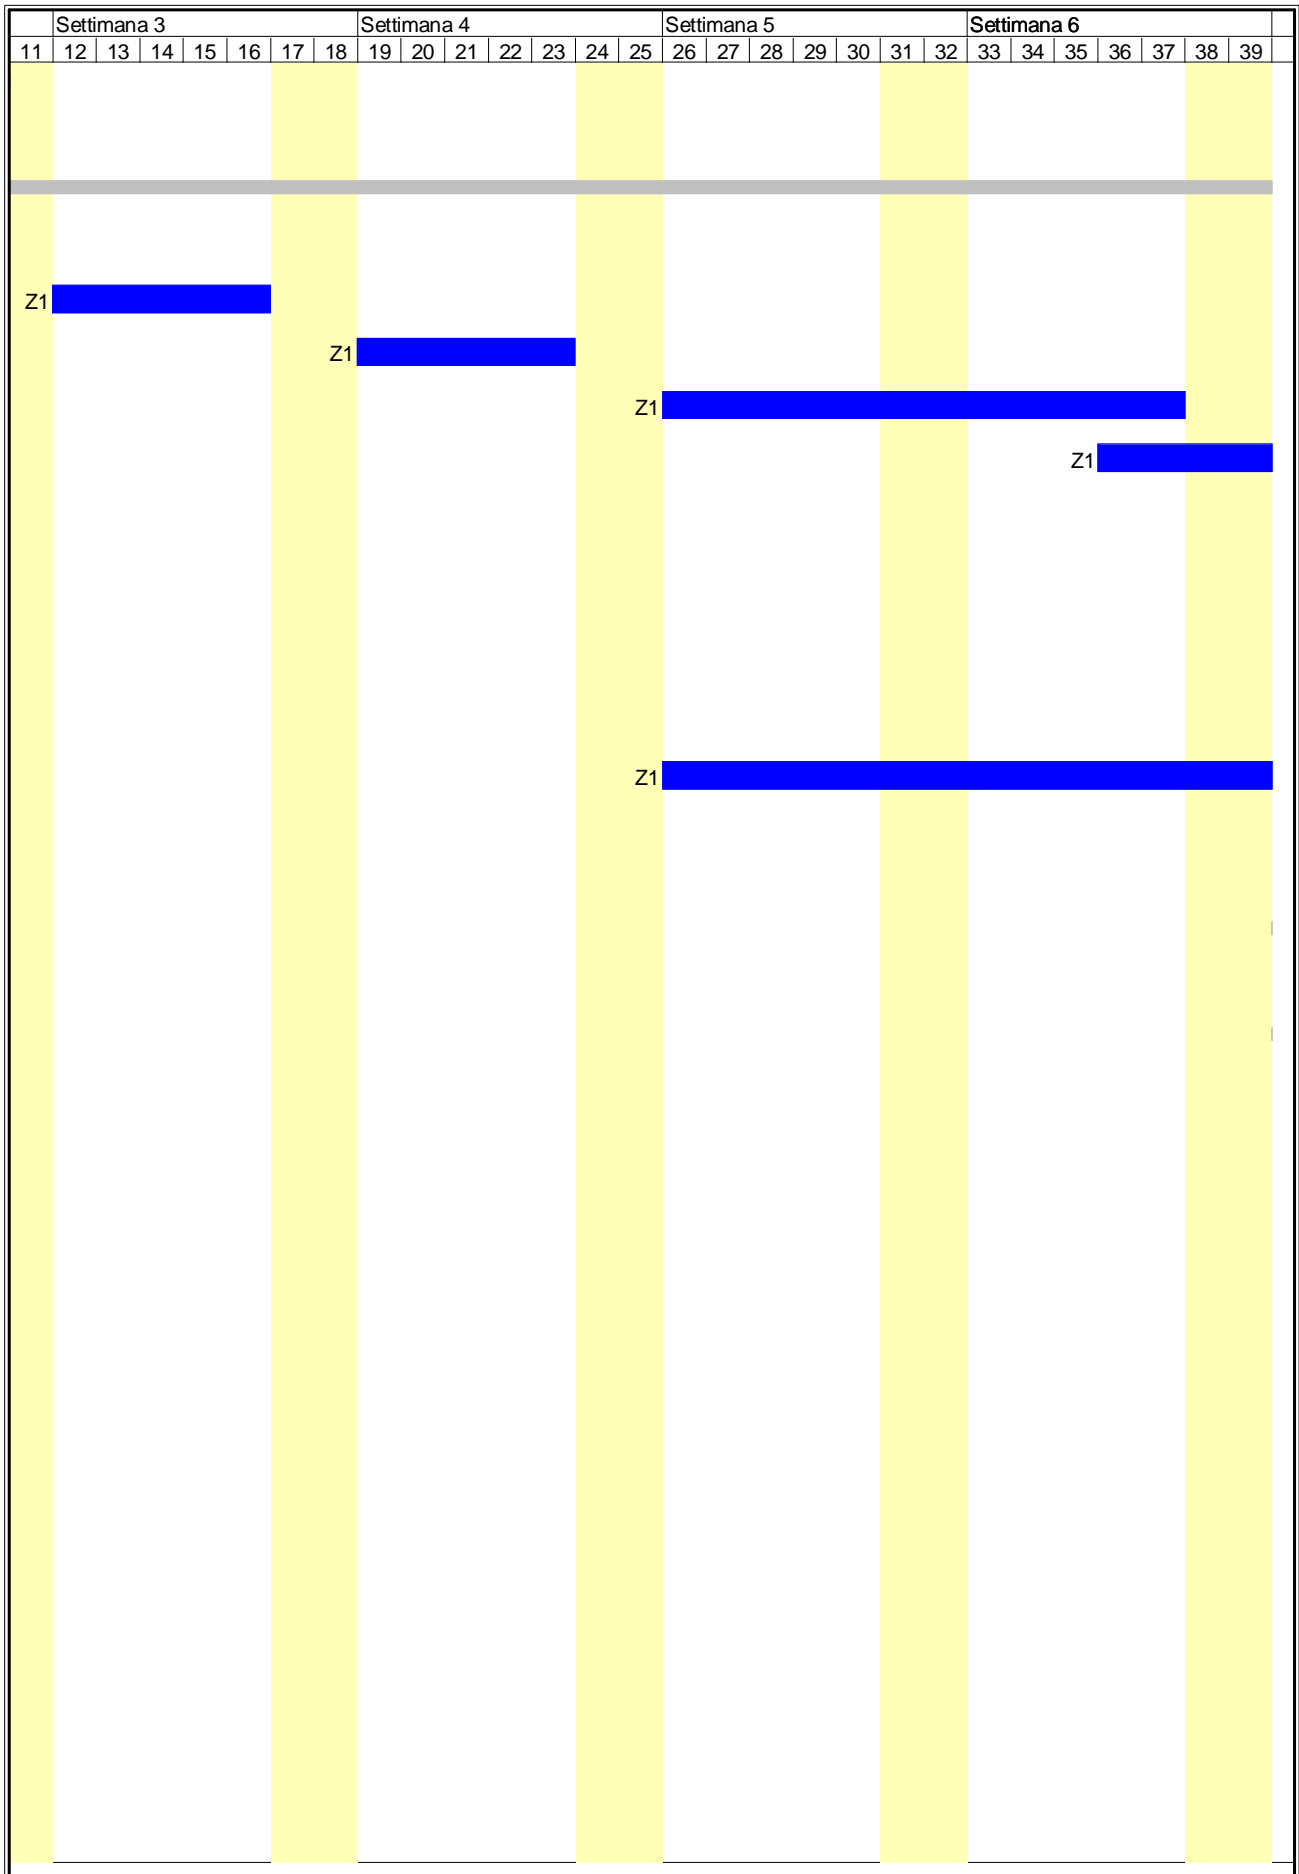

[illegible]

